Ms Project : Pourquoi suivre l'avancement d'un projet?


1. Objectif

- Savoir déplacer un projet
- Etre capable de créer une date de référence d'un projet.

- Description
  - Faire un suivi permet de repérer les variations, d'intervenir avant que les problèmes ne deviennent critiques et d'augmenter sa base de connaissances personnelles
  - Une fois qu'un projet est rentré sur **MS Project**, il est possible d'assurer son suivi.
  - Suivre le projet signifie que nous allons informer à un instant donné (une date) l'état d'avancement réel du projet.
  - **MS Project** sera alors capable de nous dire si le projet est dans les temps par rapport à la planification initiale, en avance par rapport à la planification ou en retard, par rapport à la planification initiale ou de départ.


    > *Le suivi de l'avancement n'est possible que si vous avez défini une planification initiale.*

- Déplacer un projet
  - **"Déplacer le projet"** change la date de début du projet et recalcule toutes les contraintes de date en fonction de ce nouveau début ;
  - Il est assez fréquent qu'un projet soit décalé dans le temps avant même qu'il ne commence.
  - Sous l'onglet **Projet**, dans le groupe **Planifier**, cliquez sur le bouton **Déplacer le projet**.

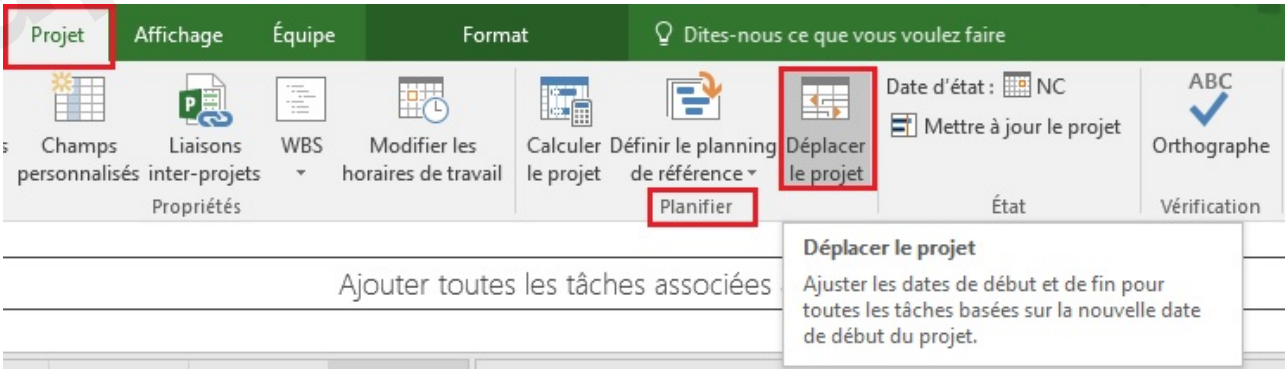

  - Saisissez ou sélectionnez la nouvelle date de début du projet dans la liste Nouvelle date de début du projet.

apcpedagogie.com

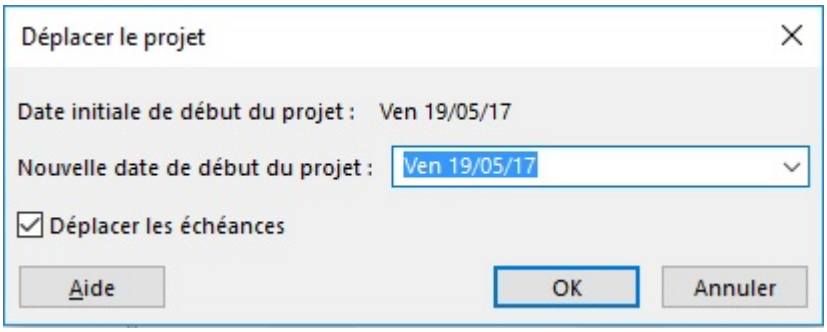

- Cochez l'option **Déplacer les échéances** si project doit également décaler les taches à contraintes.
- Validez par le bouton **Ok**.

Sommaire du cours MS Project

Source : https://apcpedagogie.com/ms-project-pourquoi-suivre-lavancement-dun-projet · téléchargé le 03/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com

apcpedagogie.com
